



Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.05.21 bis 31.05.21

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen

Einbringen der Querbohlen zwischen den Vertikalträgern.
Erstellen der Anker für die zweite Rückverankerungsebene.
Aushub bis Übergabeebene Rohbau.


Einrichten der Drainage und Wasserhaltung.

Beginn der Baustelleneinrichtung Rohbau.
Beginn der sukzessiven Übergabe an den Rohbau.

**Bis voraussichtlich 07.05. ist auf der Baustelle RUN
Zweischichtbetrieb geplant. Somit ist auch nachts in geringem Maße
mit Baulärm im Umfeld des Baugrunds zu rechnen. Das Baufeld wird
für die Nachtarbeit ausgeleuchtet.**

**Erhöhtes Transportaufkommen durch LKW- und Traktoren-Verkehr
im Bereich "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark".**

**Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten
Verschmutzungsgrad der Tiefstraße Ost zu rechnen.**

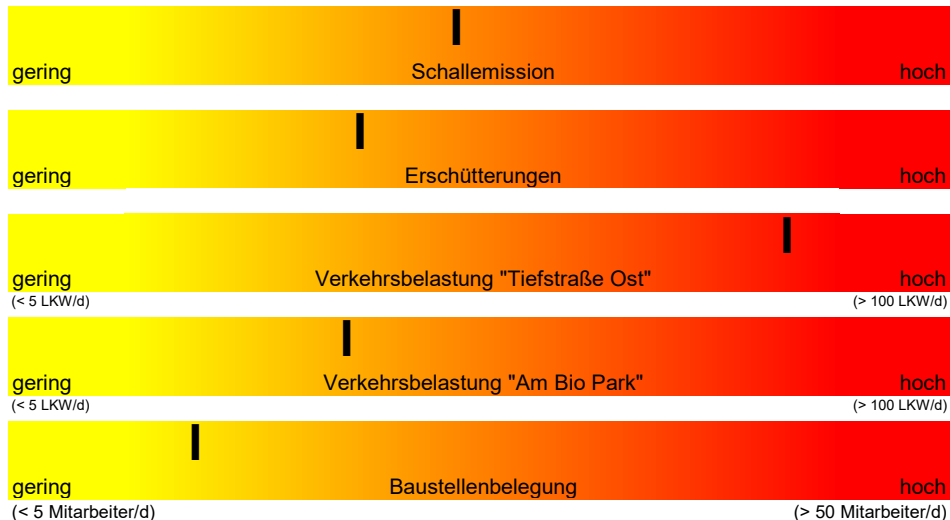

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
