

Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.06.21 bis 30.06.21

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Aushub Übergabeebene Rohbau.
Übergabe von Spezialtiefbau an Rohbau.
Bodenverbesserung durch einarbeiten von Kalk-Zement im Bereich des Bauteils 2 (Westseite Baufeld).
Bodenverbesserung durch CSV-Säulen im Bereich U2 des Bauteils 1 (Ostseite Baufeld): Bohrungen und einbringen Trockengranulat.

Einrichten der Wasserhaltung für Niederschlags- und Schichtenwasser.
Beginn Erstellung untere Drainage.

Baustelleneinrichtung Rohbau.
Aufstellen Baukräne.

Ende Juni, Anfang Juli Straßensperrung der Tiefstraße Ost für 2-3 Tage zur Anlieferung und zum Aufstellen der Krananlage erforderlich. Es erfolgt eine gesonderte Information zum genauen Zeitraum.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.

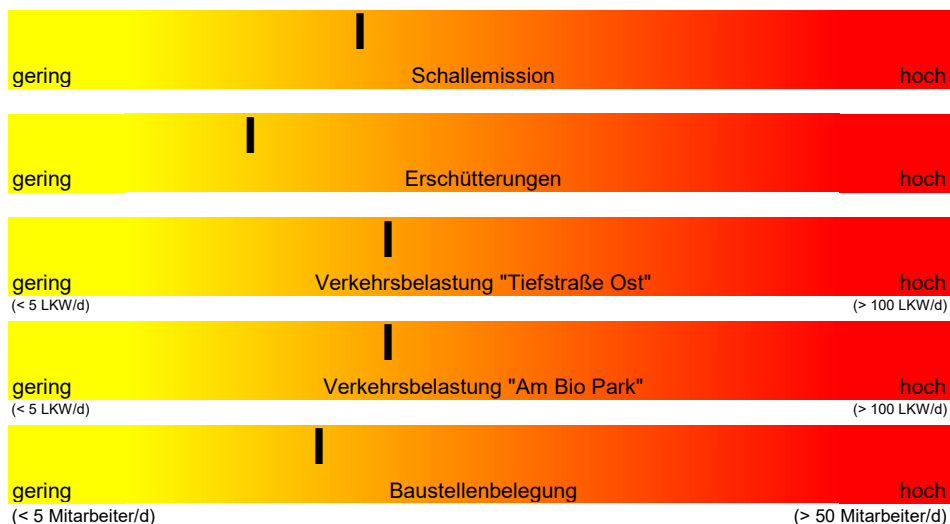

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
