



Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.07.21 bis 31.07.21

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Räumung der Baustelleneinrichtung Spezialtiefbau.

Bodenverbesserung durch einarbeiten von Kalk-Zement im Bereich des Bauteils 2 (Westseite Baufeld).
Fertigstellen Baustelleneinrichtung Rohbau.
Aufstellen der Baukräne.
Erstellen der Fertigteilschächte Bauteil 2 (Westseite Baufeld).
Betonieren Sauberkeitsschicht für Bodenplatte Bauteil 2
Je nach Baufortschritt ggf. Beginn mit unterer Bewehrungslage.
Erstellen weiterer CSV-Testfelder.
Bodenverbesserung durch CSV-Säulen im Bereich U2 des Bauteils 1 (Ostseite Baufeld): Bohrungen u. einbringen Trockengranulat.

Erstellung untere Drainage.
Verlegen der Grundleitungen (Abwasser) unter und in der Bodenplatte Bauteil 2 (Westseite Baufeld).

Von 26.07. bis einschließlich 28.07. ist eine Straßensperrung der Tiefstraße Ost zur Anlieferung und zum Aufstellen der Krananlage erforderlich. Eine Umfahrung des gesperrten Bereichs über die Straße "Am Biopark" ist jederzeit möglich.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.

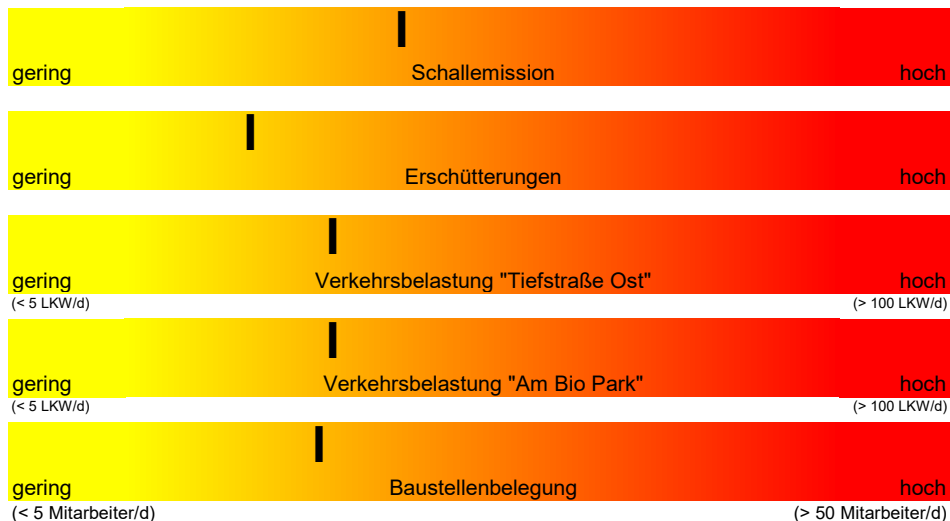

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
