

Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.11.21 bis 30.11.21

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Wände und Pfeiler Bauteil 2 fertig.
Zwischendecke Bauteil 2 fertig.
Betonierten Decke Bauteil 2.
Abdichtung der Außenwände Bauteil 2.
Hinterfüllarbeiten Bauteil 2 (erster Abschnitt).

Wände 2. UG Bauteil 1 fertig.
Betonieren Decke 2. UG Bauteil 1.
Abdichtung der Außenwände 2. UG Bauteil 1.
Beginn CSV-Säulen zur Bodenverbesserung 1. UG Bauteil 1.
Beginn Grundleitungen 1. UG Bauteil 1.
Hinterfüllarbeiten 2. UG Bauteil 1 (erster Abschnitt).

Blitzschutz und Erdungsarbeiten.
ggf. Betonsägearbeiten Medienkanal Bestand (unter Tiefstraße Ost).

Durch die umfangreichen Betonierarbeiten sowie der An- und Abfahrt von Schalungselementen wird es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" kommen.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.

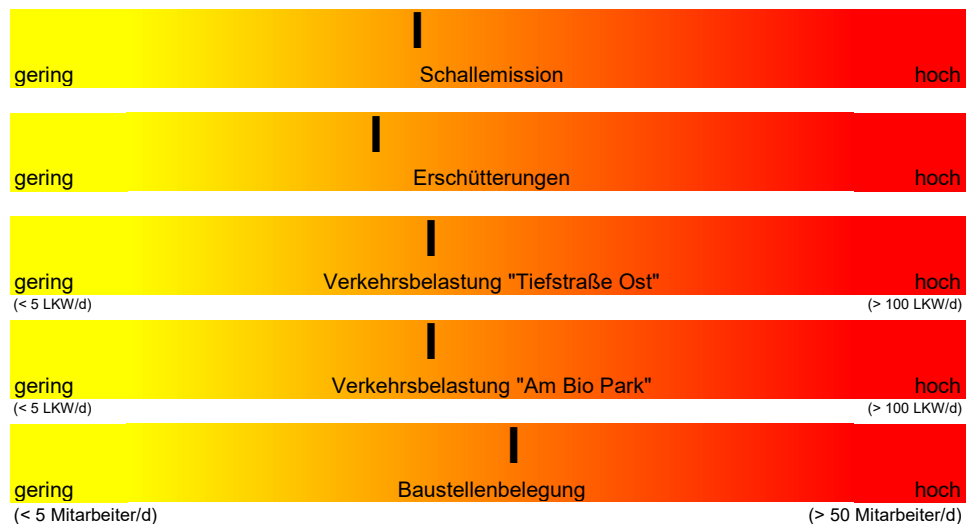

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
