

## Baubetriebliche Monatsübersicht

**Zeitraum 01.08.22 bis 31.08.22**

### Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Fertigstellung Deckenhängende Konstruktionen Bauteil 2.  
Trockenbau Garderobe/WC Bauteil 2 (Vorbereitung für  
Bodenbeschichtung).  
Beginn Bodenbeschichtungsarbeiten Bauteil 2.

Fertigstellung Betonvorhangfassade Attika und 1. UG.  
Dampfsperre Dach.  
Dämm- und Abdichtungsarbeiten Dach.  
Fertigstellung Fassade (Pfosten + Riegel) EG.  
Ausführung Fassade (Pfosten + Riegel) OG.  
Fertigstellung Beschichtungsarbeiten 1. UG.  
Ausführung Trockenbau Bauteil 1

Fertigstellung Rohbau.  
Rückbau Baustelleneinrichtung Rohbau.  
Fertigstellung Kanalanschlussarbeiten.  
Teilerstellung Überdeckung Bauteil 2.

**Sperrung der "Tiefstraße Ost" für Kanalanschlussarbeiten und  
Abdichtung Medienkanal Ende August / Anfang September für ca. 2  
Wochen. Weitere tageweise Sperrungen der "Tiefstraße Ost" sind  
möglich und werden gesondert bekannt gegeben. Eine Umfahrung  
des gesperrten Bereichs über "Am Biopark" ist jederzeit möglich.**

**Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten  
Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu  
rechnen.**

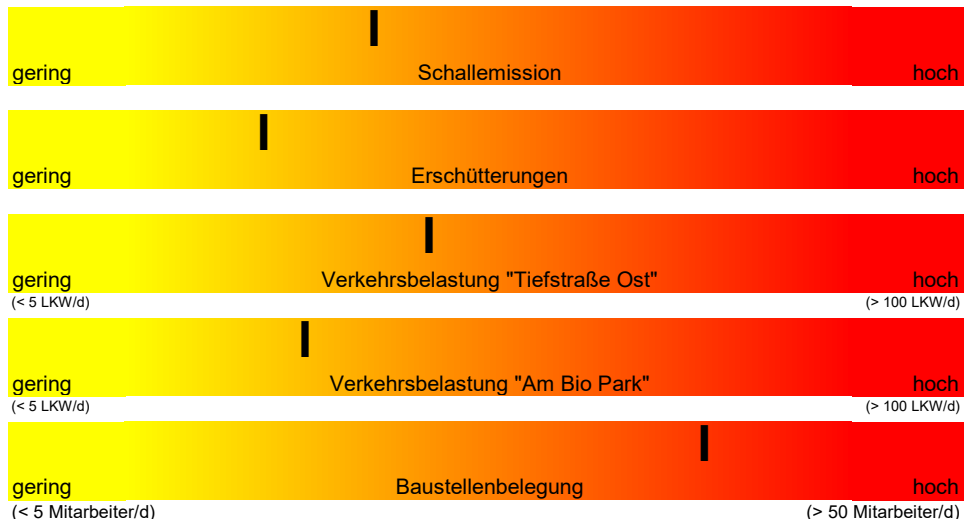

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
