



## Baubetriebliche Monatsübersicht

**Zeitraum 01.02.21 bis 28.02.21**

### **Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen**

Fertigstellung Voraushub bis 2 m Tiefe unter Oberkante Gelände  
Fertigstellung Baustellenstraßen und Lagerplätze (Terrassierung)  
Beginn Trägerbohrarbeiten und Einbringung der Bohlenträger  
Beginn Einbringen der Bohlen bis zur ersten Rückverankerungsebene

Einrichtung Baustellenabwasser


Gegebenenfalls Anlieferung von Gerät über den Studentenweg westlich des Baufelds (Vorplatz Haupteingang Vorklinikum). Es erfolgt eine gesonderte Information wenn dies nötig wird.

**Erhöhter LKW- und Traktoren-Verkehr im Bereich Tiefstraße Ost.**

**Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Vermutzungsgrad der Tiefstraße Ost zu rechnen.**

**Einbahnstraßenregelung wird für Baustellenverkehr aufgehoben.**

**Halteverbot im südlichen Bereich der Tiefstraße Ost.**

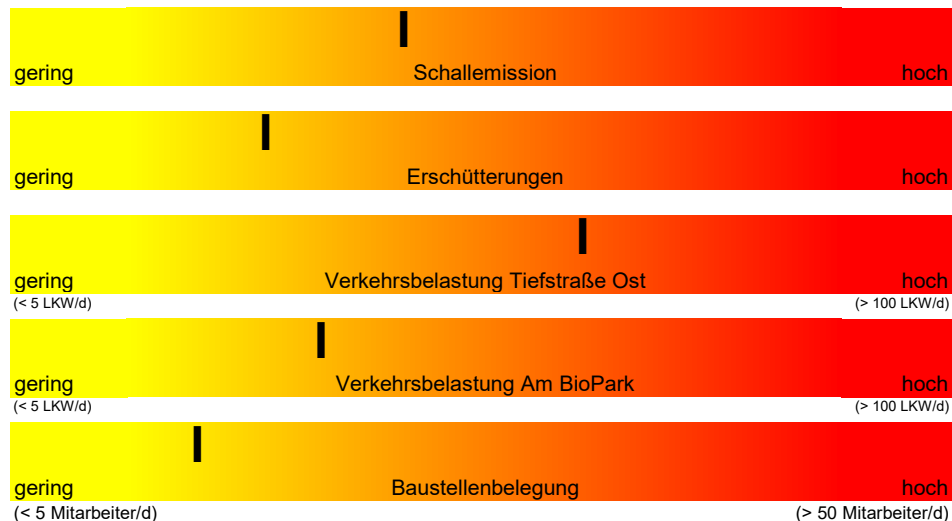

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
